Terminski plan Aglomeracija Fužine, Vrata
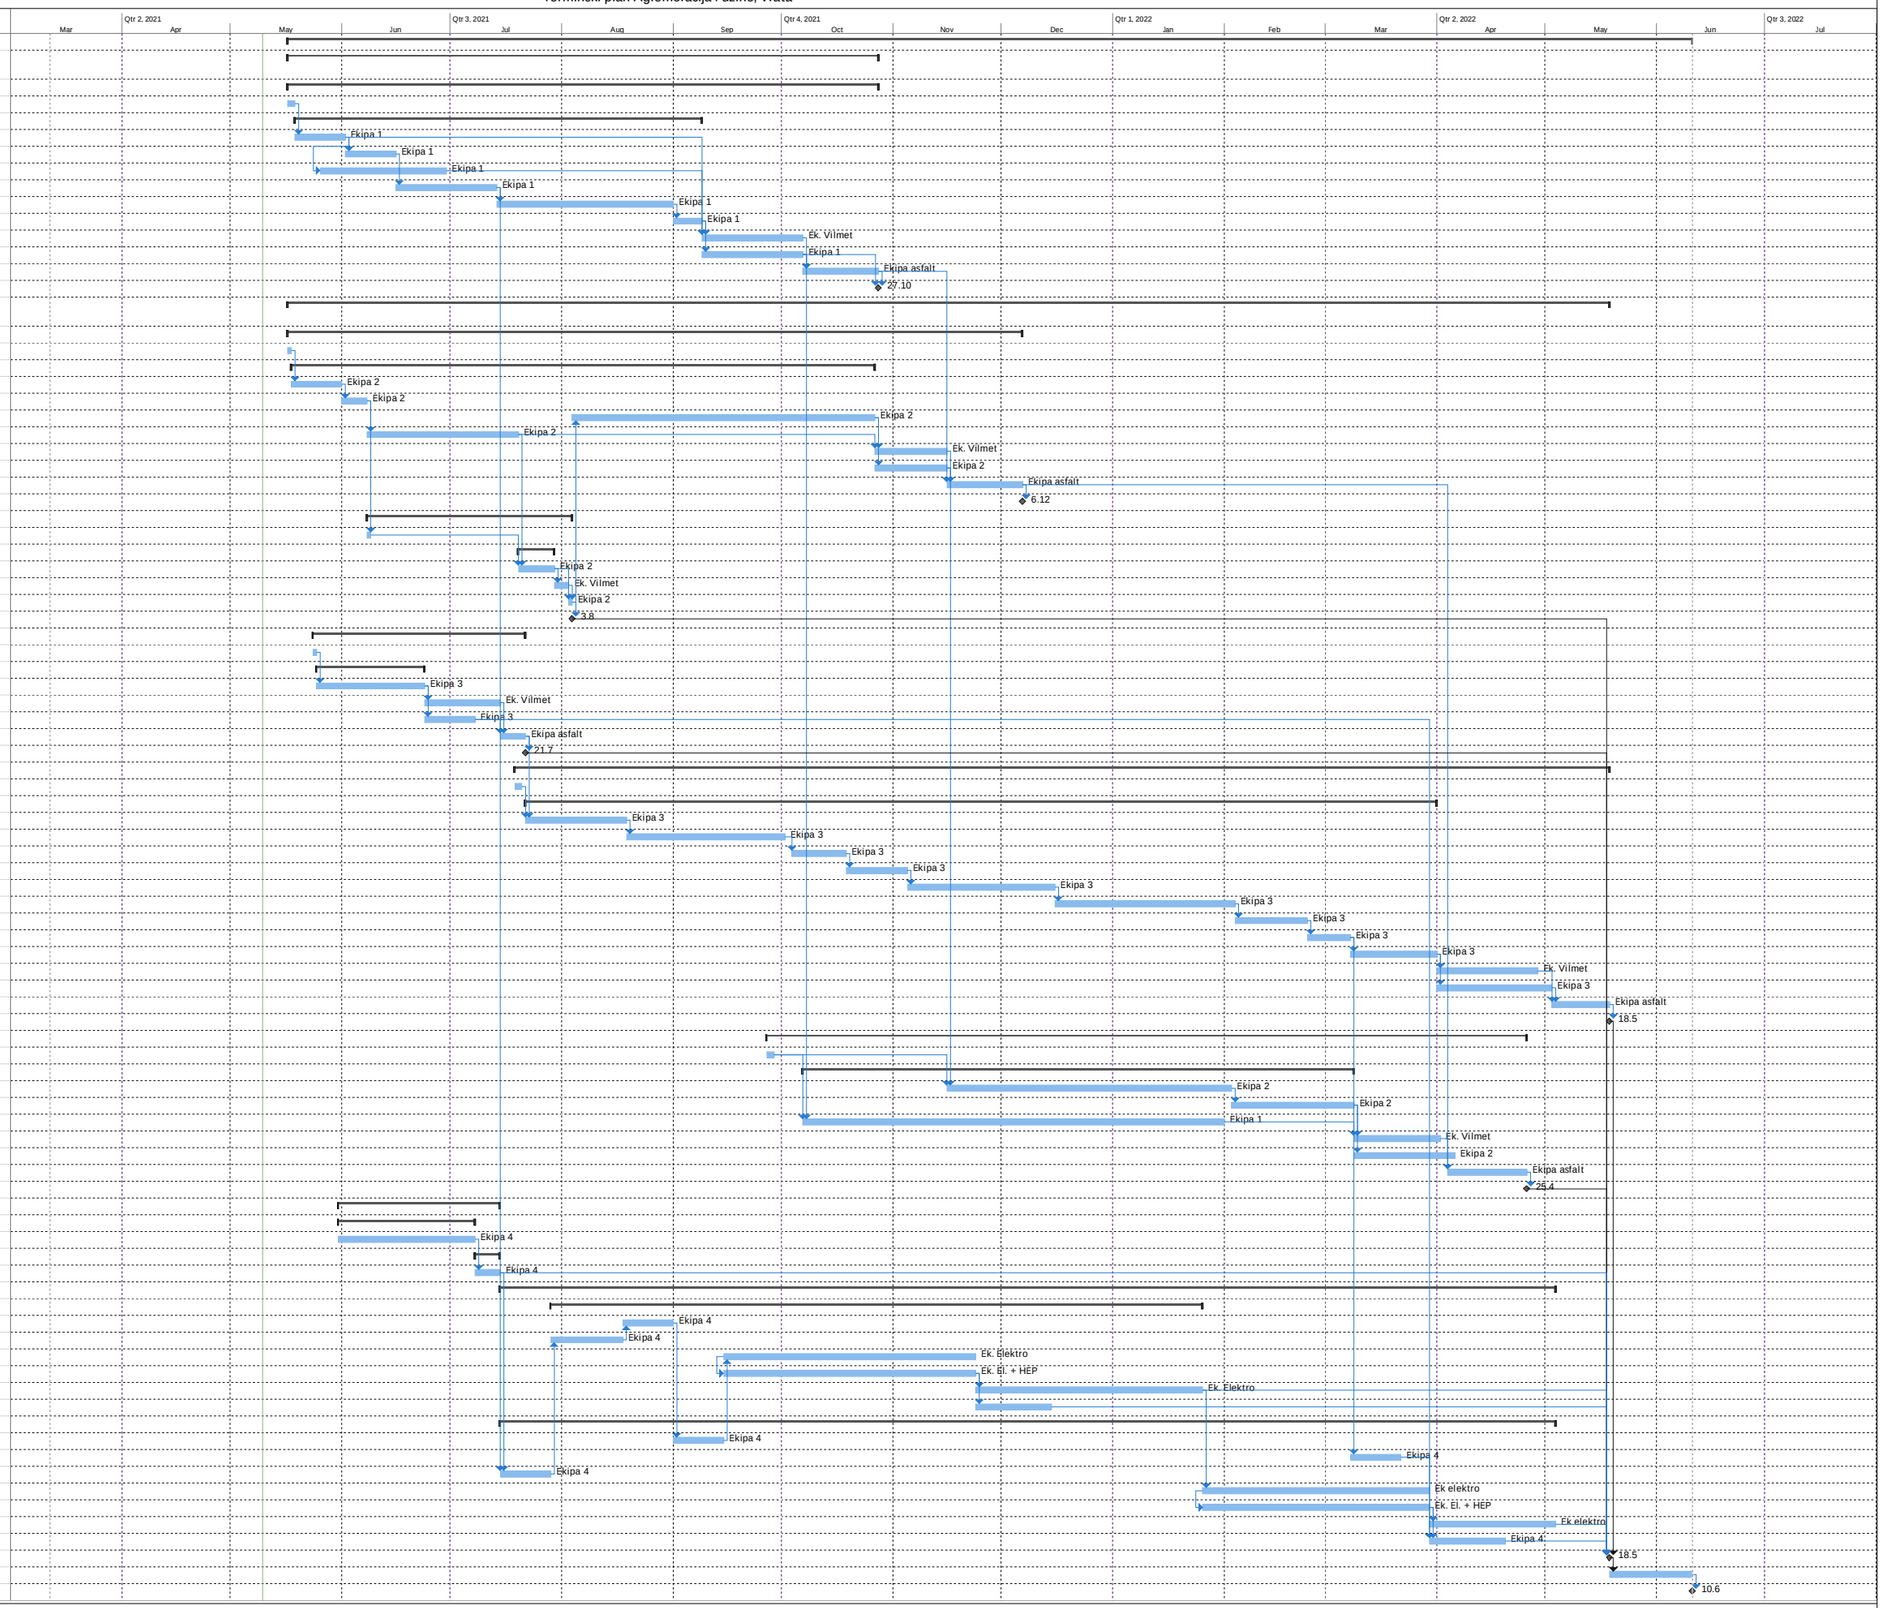
ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Jed. mjere	Dnevna količina	Ukupna količina
1	AGLOMERACIJA FUŽINE, VRATA	255 days	Mon 17.5.21	Fri 10.6.22			
2	IZGRADNJA SJO I REKONSTRUKCIJA VODOVODA VRATA	118 days	Mon 17.5.21	Wed 27.10.21			
3	ŽC 5068	118 days	Mon 17.5.21	Wed 27.10.21			
4	Pripremni i geodetski radovi	2 days	Mon 17.5.21	Tue 18.5.21			
5	Kanalizacija i vodovod uklj. KP	81 days	Wed 19.5.21	Wed 8.9.21			
6	SK6 od RO12 do CS4	10 days	Wed 19.5.21	Tue 1.6.21	m'	38,9	389
7	SK5 I TC 4 + spoj SK33	10 days	Wed 2.6.21	Tue 15.6.21	m'	20,75	207,5
8	TC4 I F1	25 days	Wed 26.5.21	Tue 29.6.21	m'	7,24	181,12
9	SK4 I F1 do CS-3	20 days	Wed 16.6.21	Tue 13.7.21	m'	7,13	142,5
10	SK3, TC3 I F1	35 days	Wed 14.7.21	Tue 31.8.21	m'	7,88	275,64
11	SK34	6 days	Wed 1.9.21	Wed 8.9.21	m'	7,5	45
12	Ispitivanja	20 days	Thu 9.9.21	Wed 6.10.21	m'	59,79	1195,76
13	Sanacija ceste	20 days	Thu 9.9.21	Wed 6.10.21	m2	360	7200
14	Završni radovi	15 days	Thu 7.10.21	Wed 27.10.21	m2	480	7200
15	Završetak dionica Vrata	0 days	Wed 27.10.21	Wed 27.10.21			
16	IZGRADNJA SJO I REKONSTRUKCIJA VODOVODA FUŽINE	238 days	Mon 17.5.21	Wed 18.5.22			
17	KOLIBICE I	146 days	Mon 17.5.21	Mon 6.12.21			
18	Pripremni i geodetski radovi	1 day	Mon 17.5.21	Mon 17.5.21			
19	Kanalizacija i vodovod uklj. KP	116 days	Tue 18.5.21	Tue 26.10.21			
20	SK13, F7.1.	10 days	Tue 18.5.21	Mon 31.5.21	m'	21,5	215
21	SK14, F.7.	5 days	Tue 1.6.21	Mon 7.6.21	m'	31,78	158,89
22	SK15, SK17, F6	60 days	Wed 4.8.21	Tue 26.10.21	m'	7,8	467,82
23	SK16, SK18 I F.6.1.	30 days	Tue 8.6.21	Mon 19.7.21	m'	8,16	244,74
24	Ispitivanja	14 days	Wed 27.10.21	Mon 15.11.21	m'	77,6	1086,45
25	Sanacija ceste	14 days	Wed 27.10.21	Mon 15.11.21	m2	357,14	5000
26	Završni radovi	15 days	Tue 16.11.21	Mon 6.12.21	m2	333,33	5000
27	Završetak dionice Kolibice I	0 days	Mon 6.12.21	Mon 6.12.21			
28	ŽC 5062	41 days	Tue 8.6.21	Tue 3.8.21			
29	Pripremni i geodetski radovi	1 day	Tue 8.6.21	Tue 8.6.21			
30	Kanalizacija i vodovod uklj. KP	8 days	Tue 20.7.21	Thu 29.7.21			
31	SK10 - od ceste do UPOV-a	8 days	Tue 20.7.21	Thu 29.7.21	m'	7,88	63
32	Ispitivanja	2 days	Fri 30.7.21	Mon 2.8.21	m'	31,5	63
33	Završni radovi	1 day	Tue 3.8.21	Tue 3.8.21	m2	300	300
34	Završetak dionice ŽC5062	0 days	Tue 3.8.21	Tue 3.8.21			
35	Turistička ulica, proširenje	43 days	Mon 24.5.21	Wed 21.7.21			
36	Pripremni i geodetski radovi	1 day	Mon 24.5.21	Mon 24.5.21			
37	Kanalizacija i vodovod uklj. KP	22 days	Tue 25.5.21	Wed 23.6.21			
38	SK12, F8	22 days	Tue 25.5.21	Wed 23.6.21	m'	7,26	159,68
39	Ispitivanja	15 days	Thu 24.6.21	Wed 14.7.21	m'	13,84	207,54
40	Sanacija ceste	10 days	Thu 24.6.21	Wed 7.7.21	m2	51,8	518
41	Završni radovi	5 days	Thu 15.7.21	Wed 21.7.21	m2	103,6	518
42	Završetak dionice Turistička ulica	0 days	Wed 21.7.21	Wed 21.7.21			
43	KOLIBICE II	193 days	Mon 19.7.21	Wed 18.5.22			
44	Pripremni i geodetski radovi	2 days	Mon 19.7.21	Tue 20.7.21			
45	Kanalizacija i vodovod uklj. KP	156 days	Thu 22.7.21	Thu 31.3.22			
46	SK19 od CS-1 do RO5, TC1	20 days	Thu 22.7.21	Wed 18.8.21	m'	6,77	135,47
47	SK19 od RO5 do RO15, F5	32 days	Thu 19.8.21	Fri 1.10.21	m'	6,94	222
48	SK25 I F5.4.	11 days	Mon 4.10.21	Mon 18.10.21	m'	7,09	78
49	SK26, F5.5.	13 days	Tue 19.10.21	Thu 4.11.21		6,72	87,34
50	SK22, F5	29 days	Fri 5.11.21	Wed 15.12.21		6,93	201,10
51	SK24, F5.3.	11 days	Thu 16.12.21	Thu 3.2.22		6,91	76,01
52	F5 od Z10 do F5.5., SK20 I TC-2	14 days	Fri 4.2.22	Wed 23.2.22		6,71	93,96
53	F5.1., SK20, TC-2	8 days	Thu 24.2.22	Mon 7.3.22		6,33	50,63
54	F5.1. od PH28 do F5.15., SK21	18 days	Tue 8.3.22	Thu 31.3.22		6,97	125,42
55	Ispitivanja	20 days	Fri 1.4.22	Thu 28.4.22	m'	53,5	1069,93
56	Sanacija Kolibice II	22 days	Fri 1.4.22	Mon 2.5.22	m2	204,55	4500
57	Završni radovi	12 days	Tue 3.5.22	Wed 18.5.22		375	4500
58	Završetak dionice Kolibice II	0 days	Wed 18.5.22	Wed 18.5.22			
59	FUŽINE CENTAR	126 days	Mon 27.9.21	Mon 25.4.22			
60	Pripremni i geodetski radovi	2 days	Mon 27.9.21	Tue 28.9.21			
61	Kanalizacija i vodovod uklj. KP	84 days	Thu 7.10.21	Tue 8.3.22			
62	SK27, F4, SK28	32 days	Tue 16.11.21	Wed 2.2.22	m'	6,85	219,17
63	SK29	24 days	Thu 3.2.22	Tue 8.3.22	m'	6,88	165
64	SK2, F3	58 days	Thu 7.10.21	Mon 31.1.22	m'	7,01	406,5
65	Ispitivanja	18 days	Wed 9.3.22	Fri 1.4.22	m'	43,93	790,67
66	Sanacija ceste	20 days	Wed 9.3.22	Tue 5.4.22	m2	155	3100
67	Završni radovi	16 days	Mon 4.4.22	Mon 25.4.22	m2	193,75	3100
68	Završetak dionice Fužine centar	0 days	Mon 25.4.22	Mon 25.4.22			
69	SANACIJA VODOPSKRBNOG CJEVOVODA	33 days	Mon 31.5.21	Wed 14.7.21			
70	Dionica S1	28 days	Mon 31.5.21	Wed 7.7.21			
71	Vodosprema Garbajel - jezero Bajer	28 days	Mon 31.5.21	Wed 7.7.21	m'	7,32	205
72	Dionica S2	5 days	Thu 8.7.21	Wed 14.7.21			
73	Prijelaz preko vodotoka "Ličanka"	5 days	Thu 8.7.21	Wed 14.7.21	m'	7,2	36
74	Crpne stanice	184 days	Thu 15.7.21	Tue 3.5.22			
75	VRATA	104 days	Thu 29.7.21	Tue 25.1.22			
76	CS-5	10 days	Wed 18.8.21	Tue 31.8.21	kom		
77	CS-4	14 days	Thu 29.7.21	Tue 17.8.21	kom		
78	Elektro-strojarski radovi	50 days	Wed 15.9.21	Tue 23.11.21	kpl		
79	Priključak na NN mrežu	50 days	Wed 15.9.21	Tue 23.11.21	kpl		
80	Puštanje u pogon	20 days	Wed 24.11.21	Tue 25.1.22	kpl		
81	Završni radovi	15 days	Wed 24.11.21	Tue 14.12.21	kpl		
82	FUŽINE	184 days	Thu 15.7.21	Tue 3.5.22			
83	CS-1	10 days	Wed 1.9.21	Tue 14.9.21	kom		
84	CS-2	10 days	Tue 8.3.22	Mon 21.3.22	kom		
85	CS-3	10 days	Thu 15.7.21	Wed 28.7.21	kom		
86	Elektro-strojarski radovi	45 days	Wed 26.1.22	Tue 29.3.22	kpl		
87	Priključak na NN mrežu	45 days	Wed 26.1.22	Tue 29.3.22	kpl		
88	Puštanje u pogon	25 days	Wed 30.3.22	Tue 3.5.22	kpl		
89	Završni radovi	15 days	Wed 30.3.22	Tue 19.4.22	kpl		
90	Završetak svih radova	0 days	Wed 18.5.22	Wed 18.5.22			
91	Tehnički pregled	17 days	Thu 19.5.22	Fri 10.6.22			
92	Primopredaja radova	0 days	Fri 10.6.22	Fri 10.6.22
